

PRODUCTION & OPERATIONS

サイト制作・公開・運用保守 ロードマップ

受注後、ローカルHTMLを「使える公開サイト」にし、
運用保守までを誰でも同じ品質で回すための実務手順。

目次

01

第1章 制作から公開まで

受注準備 → 制作（F0-F3） → ドメイン・公開（F4-F7）

02

第2章 システム構成と画面例

公開サイトの仕組み・完成サイト・月次レポートの実例

03

第3章 運用保守

落とさない／育てる（分析）／報告する＋障害・契約

採用方式と全体フロー

方式: 静的サイト + 外部サービス埋め込み

- ✓ 速い テンプレにJSONを流すだけで土台が完成
- ✓ 安い ホスティングほぼ無料・サーバ管理不要
- ✓ 壊れにくい WordPressの更新事故・乗っ取りが無い
- ✓ 動的機能 予約/問い合わせは実績ある外部SaaSを埋め込む

全体フロー

- 受注・キックオフ
- ヒアリング / 素材回収
- 制作 (content.json → build)
- 動的機能を組み込み (フォーム/予約/解析)
- ドメイン取得 → デプロイ公開
- QA / SEO / GBP連携
- 納品・レクチャー・請求
- ▶ ▼ 運用保守フェーズへ

CHAPTER 1 ・ BUILD & PUBLISH


第 1 章

制作から公開まで

- 受注直後の準備とヒアリング (F0)
- 制作環境・テンプレートでサイト化 (F1–F2)
- 動的機能を動かす：フォーム・予約・計測 (F3)
- ドメイン取得・デプロイ・QA・納品 (F4–F7)

第1章

制作～公開の7フェーズ



標準リードタイム: 素材がそろってから公開まで最短5～10営業日（スタンダード）。

最大の関門は F3「動的機能を動かす」＝予約・問い合わせを実際に届く状態にすること。

受注直後の準備

受注直後

ゴール: 売る土台（情報と段取り）を固める

キックオフ日程を確定（30分ヒアリング枠）

ヒアリングシートを一緒に埋める

素材回収の段取り（写真・ロゴ・原稿・SNS）

ドメイン / メール方針を確認

公開希望日を確定（繁忙期の前を狙う）

ここで決める3点

- 使うテンプレート
- 予約の方式（電話/予約SaaS/フォーム）
- ドメインは新規 or 既存

制作環境・ツール一式（一度だけ整える）

用途	サービス	費用
コード/履歴管理	GitHub	無料
ホスティング	Cloudflare Pages（推奨） / Netlify / Vercel	無料
ドメイン	Cloudflare Registrar / お名前.com	~1,500円/年
問い合わせフォーム	Tally / Formspree	無料枠
ネット予約	Airリザーブ / RESERVA / 飲食はebica等	無料～
アクセス解析	GA4 + Microsoft Clarity	無料
画像最適化	Squoosh / TinyPNG	無料

ローカルは Python3 だけあればよい（build_site.py 実行用）。このリポジトリ構成をそのまま使う。

制作（ローカルで形にする）

制作

ゴール: content.json + 写真で土台を完成

ヒアリング内容を content.json に転記

写真を圧縮（長辺1600px・各150KB以下）

原稿を整える（AI叩き台→店の言葉に）

build_site.py でビルド

スマホ幅で崩れないか確認

品質の8割は写真

- 撮影 or 既存を厳選
- images/に同梱しURLは相対パス
- URL切れ防止・表示も高速

動的機能を「動く」状態にする

問い合わせフォーム

Tally 埋め込み or Formspree。
HTMLフォーム送信→店のメール/LINE
へ。
reCAPTCHA/ハニーポットでスパム対策。

ネット予約

飲食=ebica/トレタ、サロン=Airリザーブ
等。
予約ページをリンク/iframe埋め込み。
作り込まない店は電話+フォームで充分。

計測（必須）

GA4 + Microsoft Clarity を全サイトに。
フォーム送信・電話タップをイベント計
測。
→ 月次レポートの数字になる。

電話 tel: と Googleマップ iframe は即動く。 フォーム・予約・計測を入れて初めて『使えるサイト』になる。

ドメイン取得・DNS

ドメイン

ゴール: サイトの住所を用意する

ドメイン名を決定（短く・店名・.com/.jp）

レジストラで取得（Cloudflareは原価更新）

店名義で取得し管理代行＝店の資産（推奨）

既存ドメインはネームサーバ/DNSを向ける

既存サイト/メールを止めない切替手順を共有

名義の選択

- 店名義（資産・推奨）
- 自社名義→解約時に移管
- 契約書の移管条項に従う

デプロイ（公開） — Cloudflare Pages

1

リポジトリ準備

sites/<店名> をGitHubに置く

2

Pages連携

Connect to Git → リポジトリ選択

3

ビルド設定

Build command: なし / 出力: sites/<店名>

4

仮URL確認

xxxx.pages.dev で表示チェック

5

独自ドメイン

Custom domains で追加→DNS設定

6

SSL自動

証明書自動発行→ https 表示でOK

Git不要なら “Upload assets” にフォルダをドラッグでも可。既存レンタルサーバがある店はFTPアップロード。

公開前後のチェック（QA / SEO / GBP）

公開前チェック

- ☑ スマホ/PCで表示崩れなし
- ☑ 電話・地図・予約・問い合わせが実際に動く(テスト送信)
- ☑ 全ページ https（混在警告なし）
- ☑ 店名/住所/電話/営業時間が正確・GBPと一致
- ☑ 画像が重すぎない（表示が速い）
- ☑ 誤字・価格ミスなし（店に最終確認）
- ☑ title/description/OGP・favicon設定

SEO・GBP連携

- title/descにエリア＋業種＋店名
- 構造化データ(LocalBusiness)
- Search Console登録＋サイトマップ
- GBPのサイト/予約リンクを更新
- GBPの写真・営業時間を最新化

納品・レクチャー・請求

納品

ゴール: 公開して終わりにしない

納品物・管理情報を整理 (URL/各アカウント)

操作レクチャー (届く場所・更新依頼の仕方)

アカウント/パスワードを管理台帳に記録

初期費の残金を請求・月額サブスク開始

保守内容・窓口・対応時間を書面で渡す

渡す / 保持を分ける

- 店に渡す情報
- こちらが管理する情報
- 台帳で一元管理


CHAPTER 2 ・ ARCHITECTURE & SCREENS

第2章

システム構成と画面例

- 公開サイトの仕組み（静的＋外部SaaS）
- 完成サイトの画面例（スマートフォン）
- 月次レポートの画面例（顧客ポータル）

システム構成図（公開サイトの仕組み）

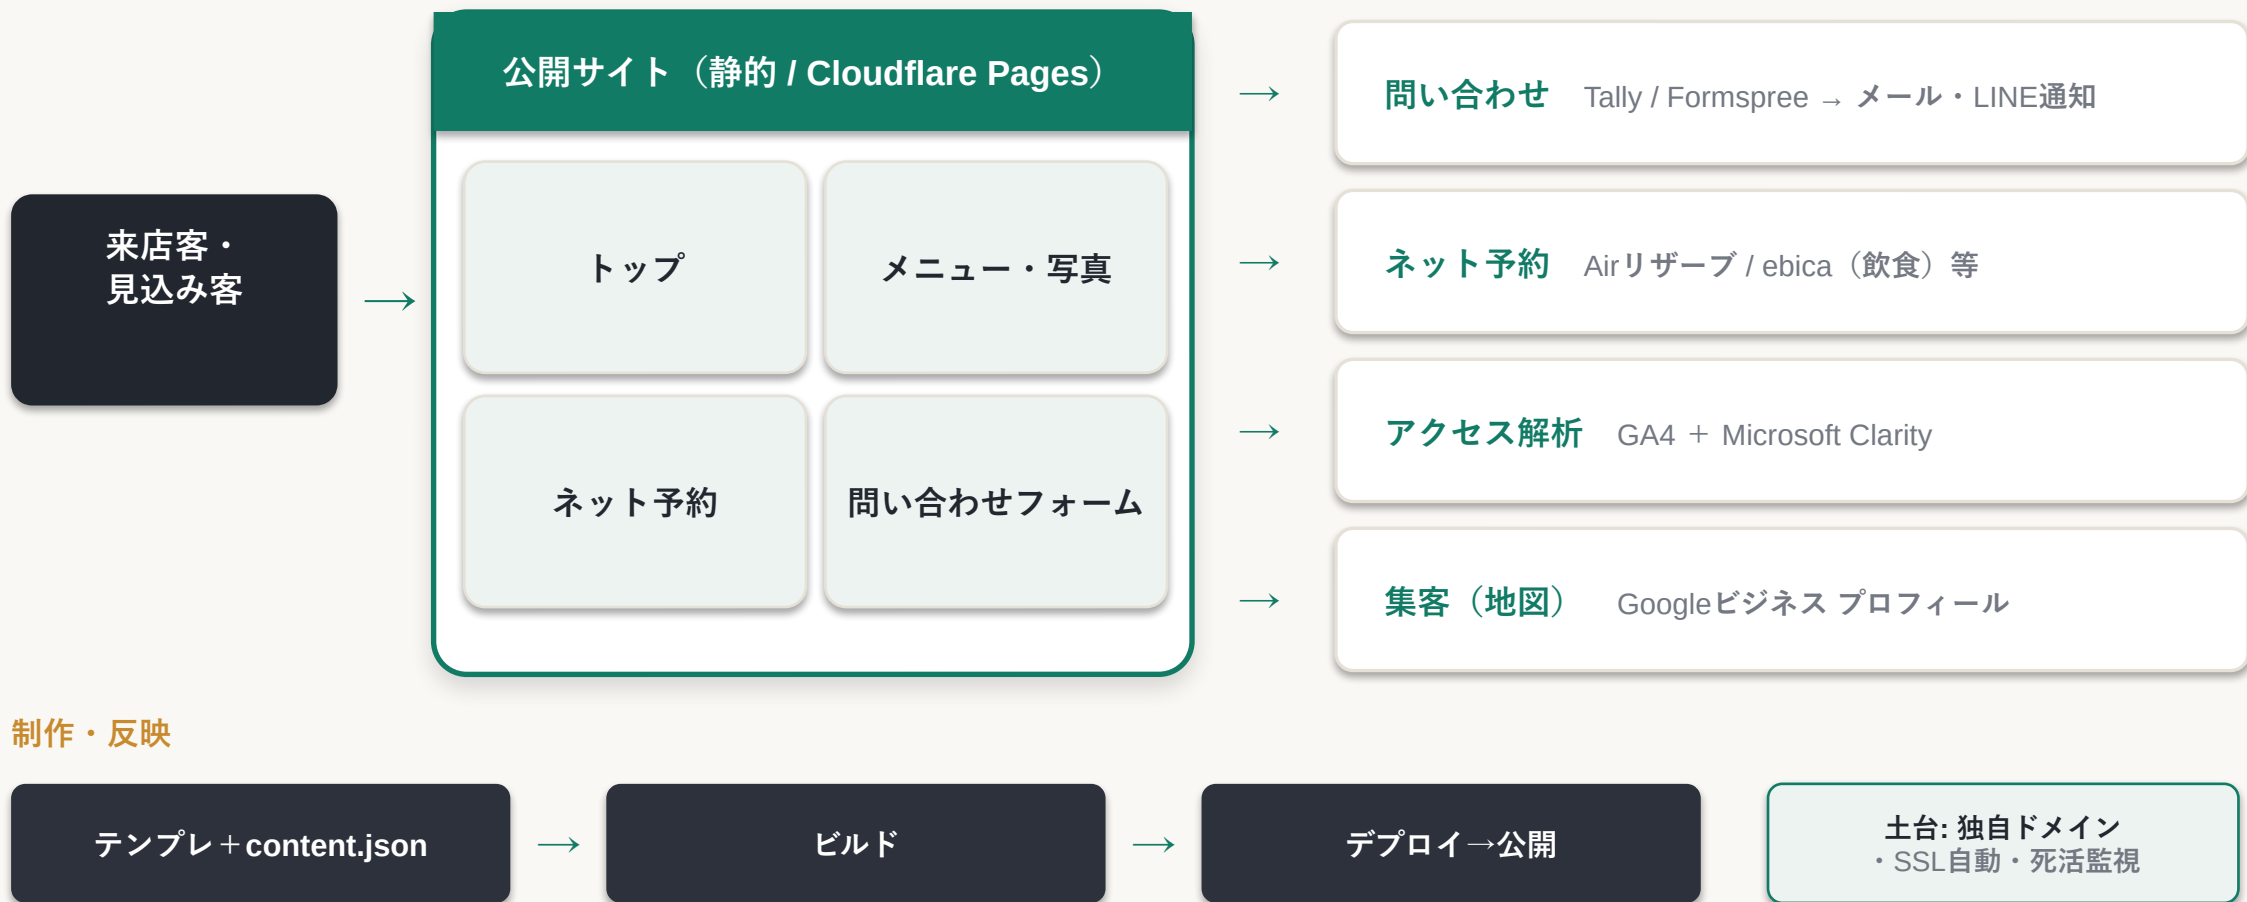


完成サイトの画面例（スマートフォン）



トップページ



お品書き・写真

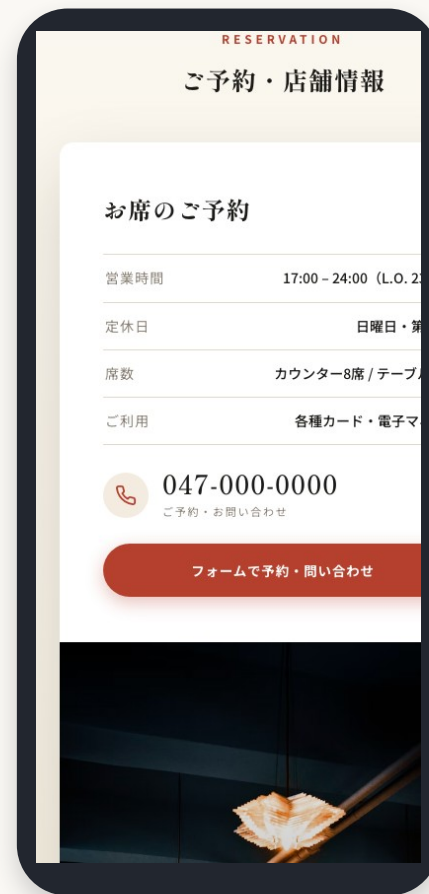

ご予約・お問い合わせ

テンプレートに店舗データを流し込むだけで、スマホ最適化された同品質のサイトを量産できる。

月次レポートの画面例（毎月、顧客ポータルで公開）



第3章

運用保守ロードマップ

月額サービスの中身 = 3本柱

01

落とさない

死活監視・バックアップ・障害対応・
ドメイン期限管理

02

育てる

MEO運用・口コミ返信・定期投稿・改
善施策

03

報告する

月次レポートで成果を可視化＝解約防
止の最大の武器

属人化が事故になる → 顧客管理台帳を最初から作る（ドメイン期限・各SaaS・請求状況）。

日常運用 と 月次運用


日常運用（随時）

- 死活監視（UptimeRobot等）で落ちたら通知
- 更新依頼: content.json編集→再ビルド→再デプロイ
- バックアップ: Gitに全履歴（画像も同梱）
- 月1でフォーム/予約のテスト送信
- 対応SLAを決める（軽微な更新は2営業日以内）

月次運用（毎月の定例）

- GBP/GA4/Clarityの数字を取得
- 口コミ返信・定期投稿（MEO手順）
- 月次レポート生成→顧客ポータルに公開
- 数字をもとに改善を1～2個実施
- 来月の提案を1つ（アップセルの種）

効果測定的设计 — 何を計測するか

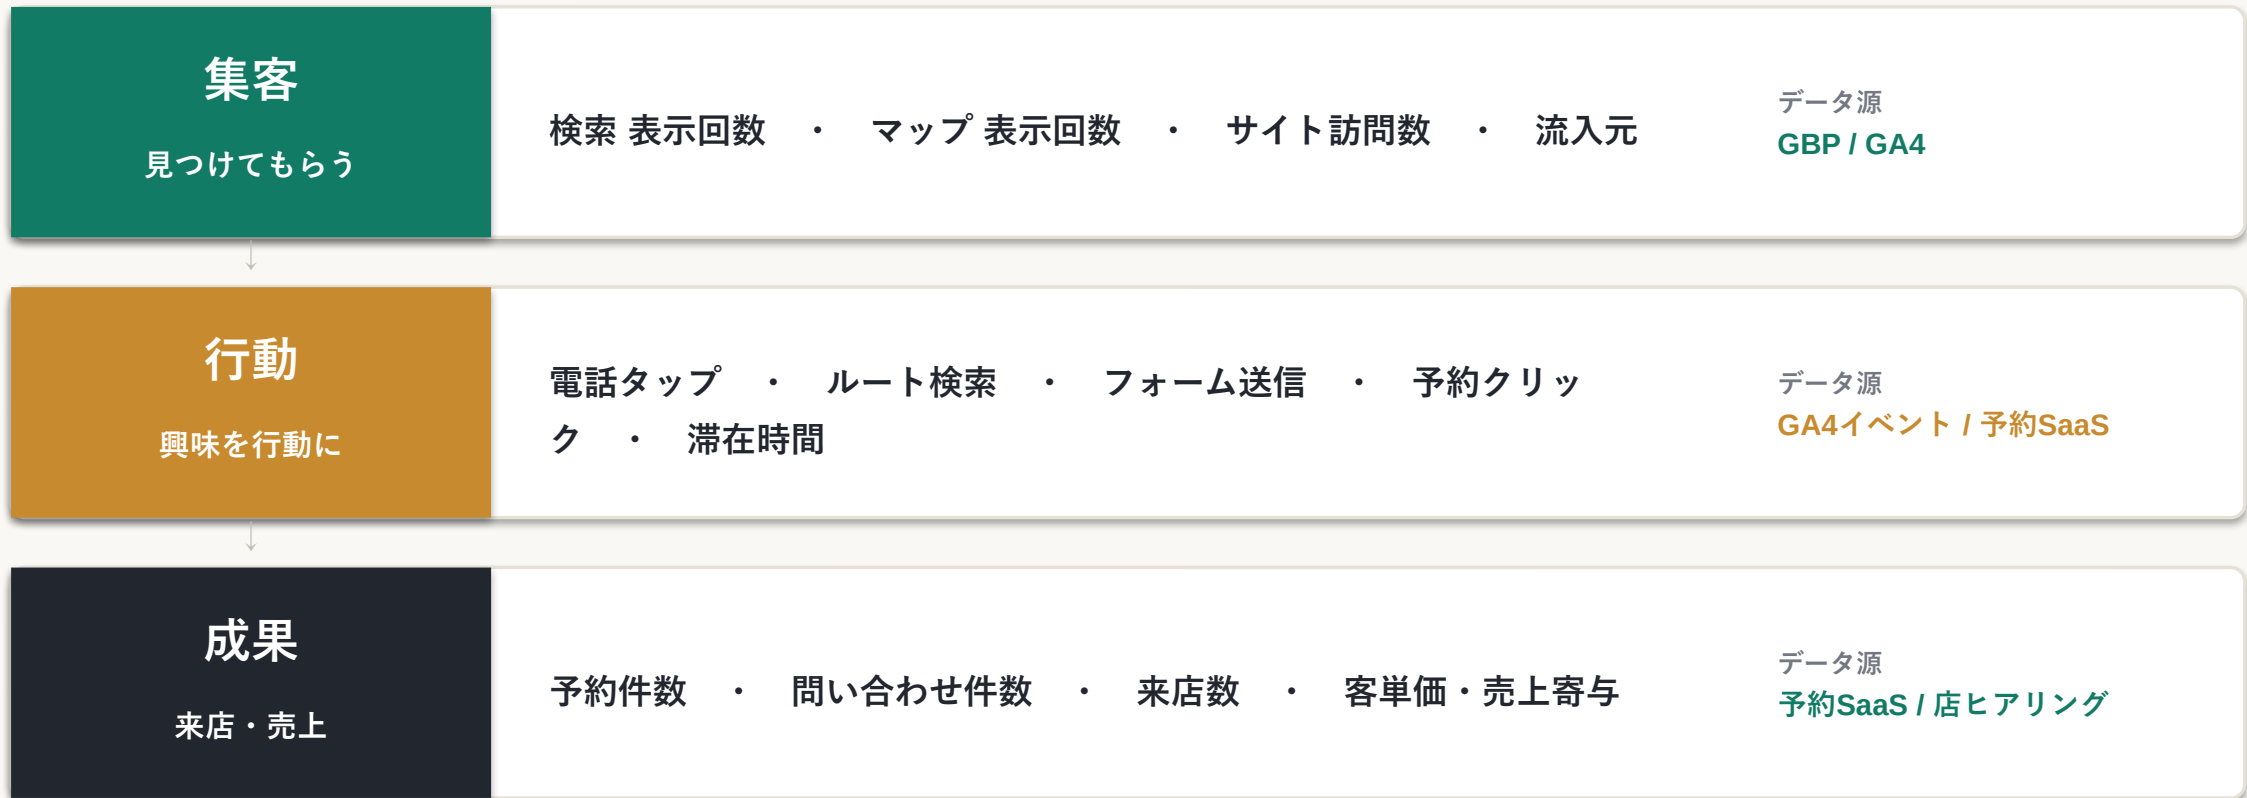

前提: 公開時に GA4 / Clarity のイベント計測（フォーム送信・電話タップ）を仕込んでおく。仕込まないと“成果”が測れない。

数字をどう読むか（分析の観点）

トレンドで見る

前月比・前年同月比で増減と季節性を把握。
点でなく線で判断。

流入元の内訳

検索 / マップ / SNS / 直接 の比率。どこを
伸ばすか決める。

行動率（CVR）

問い合わせ ÷ 訪問。サイトの“効き”。低け
れば導線を改善。

ヒートマップ・離脱

Clarityで見られない箇所・離脱点を発見。
改善の根拠に。

検索キーワード

どんな語で来たか → 訴求・文言・メ
ニュー名を最適化。

施策の効果検証

施策の前後で数字を比較。効いた施策は続
け、ダメは止める。

月次レポートで“価値”を可視化する

レポートの構成（章立て）

- 01 ご挨拶・今月のサマリー
- 02 今月のKPI（前月比つき）
- 03 Google / MEO 指標
- 04 今月実施した施策
- 05 来月のご提案

伝え方の原則

- ✓ 専門用語を使わない（数字を日本語で）
- ✓ 「予約〇件増」など店の利益で語る
- ✓ 良い点も課題も正直に書く
- ✓ 必ず“来月の提案”を1つ添える
- ✓ 毎月同じ日に提出してリズムを作る
- ✓ 対面 or 電話で5分、口頭でも説明する

04_サイトテンプレート/report で自動生成 → 毎月の公開が“払う価値”の証明＝解約防止の最大の武器。

数字を成果に変える改善サイクル



🔄 毎月この1周を回す。 分析（Check）と報告（Act）はセット。レポートが次の施策の起点になる。

回し続けるほど数字が伸び、解約が減り、紹介が生まれる → MRRと事業価値が積み上がる。

第3章

障害・トラブル対応フロー

事象	一次対応	恒久対応
サイトが表示されない	監視通知で即検知→DNS/ホスティング確認	原因切り分け・再デプロイ
ドメイン期限切れ（最重要）	自動更新ON徹底・期限を台帳管理	期限60日前にアラート
SSLエラー	証明書の自動更新状況を確認	ホスティング側で再発行
フォーム/予約が届かない	テスト送信で再現→通知先/迷惑メール確認	サービス設定見直し
スパム大量	reCAPTCHA/ハニーポット強化	提供元の対策ON
炎上口コミ相談	冷静な返信文・事実確認	改善アクションと一緒に検討

ドメイン期限切れだけは絶対防ぐ（復旧不能・信用失墜）。自動更新ON＋台帳＋カレンダー通知の三重で守る。

更新・アップセル・解約 / 推奨構成

契約の回し方

更新 更新月前に成果サマリー提示→自然に継続

アップセル 撮影/ページ追加/LP/予約強化/SNS/クーポン

解約・移管 残債案内→データ/ドメイン移管→GBP返却→停止

KPI 稼働率/対応速度/レポート提出率/継続率/紹介数

推奨スターター構成

- ホスティング: Cloudflare Pages
- ドメイン: Cloudflare Registrar
- 問い合わせ: Tally
- 予約: Airリザーブ（飲食はebica等）
- 解析: GA4 + Microsoft Clarity
- 監視: UptimeRobot
- 会計/決済: freee/MF + Stripe/Square

→ 1サイトの原価はドメイン代（年~1,500円）のみ

まとめ

静的サイト + 外部SaaS埋め込みで、速く・安く・壊れにくく作る。

F3『動的機能を動かす』が関門。フォーム・予約・計測まで入れて初めて使えるサイト。

公開はCloudflare Pages（無料・独自ドメイン・SSL自動）。原価はドメイン代のみ。

運用保守＝落とさない・育てる・報告する。月次レポートが解約防止の要。

ドメイン期限切れは三重で防止。属人化は台帳で潰す。

詳細手順は [docs/サイト制作・公開・運用保守ロードマップ.md](#) ／ 作業はチェックリストで管理。
